

PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 108 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS

OBJETIVO: Culminar las obras iniciadas en 108 establecimientos educativos según los requerimientos pedagógicos y socioculturales.

DATOS GENERALES

Periodo reportado	Desde: 01/07/2022	Hasta: 31/12/2022
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	₡ 46.134.643.694	
Fecha de inicio	22/12/2014	Fecha de finalización
		31/12/2022 - Según Resolución CAFEEI N° 25/2021

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados* acumulados al 31/12/2022, en ₡


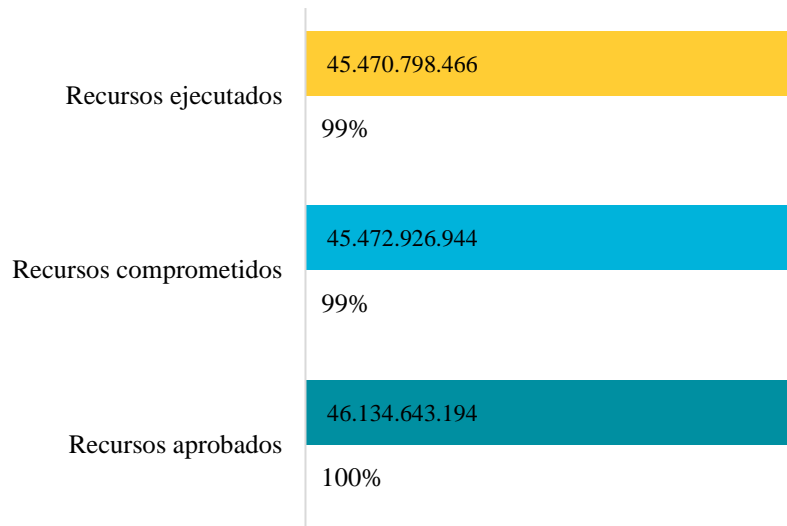


Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 31/12/2022, en ₡

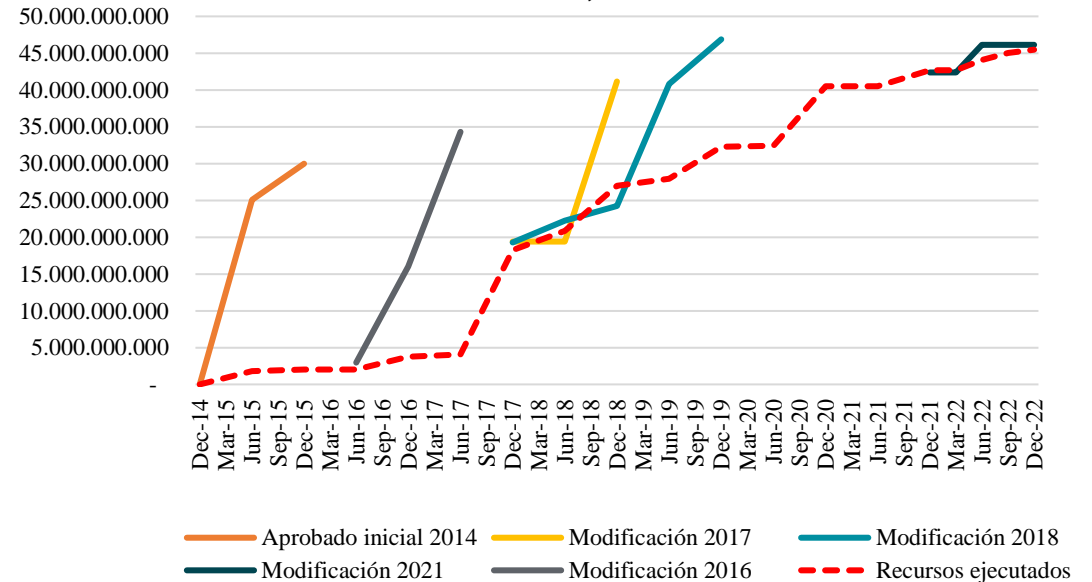

*La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo AFD (fiduciario)

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 31/12/2022 EN ¢**

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS AL 31/12/22	METAS ACUMULADAS LOGRADAS AL 31/12/22	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS
TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO						46.134.643.694	45.472.926.944	45.472.926.944
Componente 1: Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar						42.157.666.079	42.155.844.602	42.155.844.602
1.1	Construcción y reparación de la infraestructura escolar	108	108	108	9	41.674.379.279	41.672.557.802	41.672.557.802
1.2	Equipamiento mobiliario	2	2	8	0	483.286.800	483.286.800	483.286.800
Componente 2: Fiscalización y supervisión de obras						3.097.386.917	2.747.491.742	2.747.491.742
2.1	Fiscalización de obras	0	0	0	0	2.016.386.917	1.891.736.872	1.891.736.872
2.2	Viáticos	N/A	N/A	N/A	0	595.199.854	371.950.940	371.950.940
2.3	Combustibles	N/A	N/A	N/A	0	160.800.146	159.403.930	159.403.930
2.4	Contratación de personal	0	0	0	0	325.000.000	324.400.000	324.400.000
Componente 3: Auditoría externa (auditoría financiera y técnica)						879.590.698	569.590.600	569.590.600
3.1	Auditoría financiera y operativa	8	8	0	0	595.000.000	285.000.000	285.000.000
3.2	Auditoría técnica de construcción (30% muestreo).	40	40	0	0	284.590.698	284.590.600	284.590.600
Componente 4: Seguimiento y monitoreo						0	0	0
4.1	Seguimiento y monitoreo	N/A	N/A	N/A		0	0	0
TOTAL, PROYECTO						46.134.643.694	45.472.926.944	45.472.926.944

**La ejecución registrada corresponde a lo obligado en el SICO

PRINCIPALES CONSIDERACIONES

- El proyecto ha finalizado el 100% de las obras con recepción definitiva, con el pendiente de reparar las falencias detectadas por la auditoría forense de obras, posterior a esto se podrá tratar el informe final de cierre.
- Las auditorías de los últimos 4 años se realizaron en el 2022, sin aplicar las posibles mejoras. Se recomienda considerar las mismas para los demás proyectos de infraestructura, como la informatización y un registro de control del proceso de seguimiento a los contratos como también el cumplimiento de la fiscalización y supervisión de obras.
- El MEC debe abordar una estrategia integral y coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a los diversos casos judicializados en varios proyectos.
